

R3.1.24~26

長野県権限代行区間（長野県東御市本海野地先）の災害復旧工事  
における護岸工の不具合事象に関する地元説明会 説明資料

# 本海野地区 地元説明会

国土交通省 北陸地方整備局  
千曲川河川事務所

# ( 1 ) 工事概要

## (1) 工事概要

工事名：令和元年台風19号千曲川権限代行区間  
(東御市海野地先) 緊急復旧工事 (その1)

受注者：株式会社大林組 北陸支店

工事場所：長野県東御市本海野地先

工期：令和元年10月23日～令和3年3月19日

# (1) 工事概要 (被災状況)





# (1) 工事概要 (施工状況)






# (1) 工事概要




標準横断図  
( A—A' )

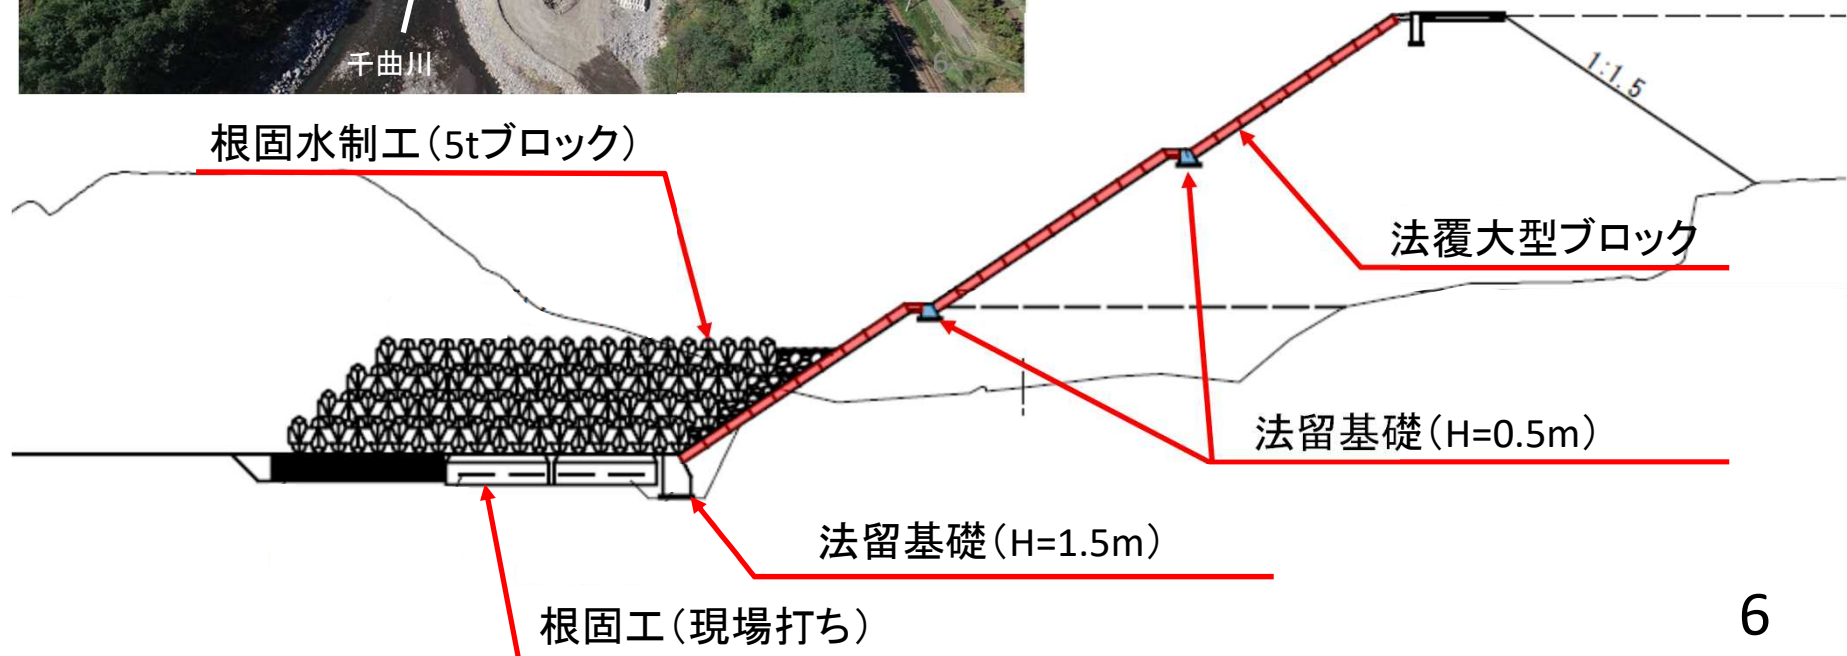

## (2) 護岸工の不具合事象の発生状況と これまでの経緯

## (2) - 1 護岸工の不具合事象の発生状況

- どうごめ のりおい
- ① 胴込コンクリート充填不足 (法覆大型ブロック背面空洞)  
→ 4,348箇所

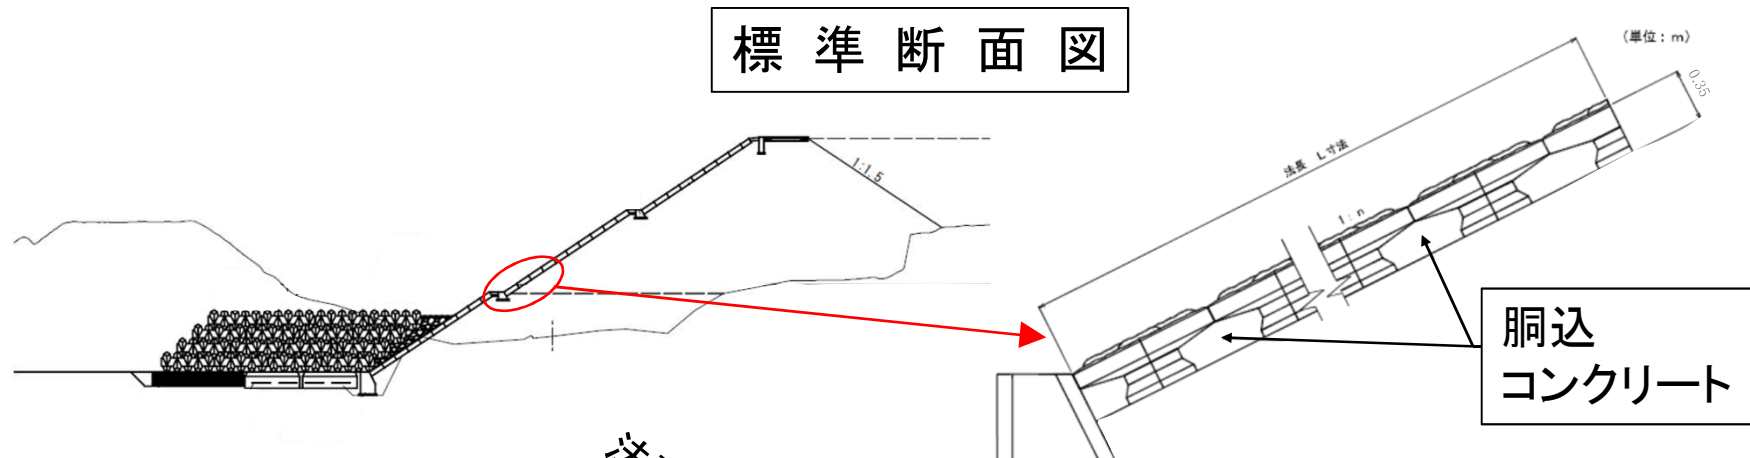

法覆大型ブロック背面空洞




法覆大型ブロック施工状況



## (2) - 1 護岸工の不具合事象の発生状況

のりおい  
②法覆大型ブロックの段差、ブロックの目開き、  
めじ  
目地施工不良 → 9,123箇所

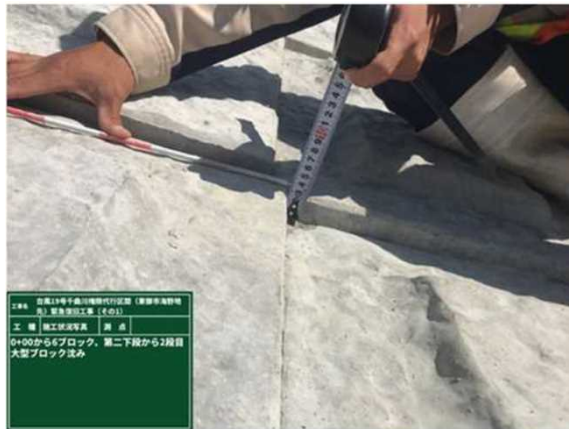

法覆大型ブロックの段差



目地施工不良



法覆大型ブロックの目開き

## (2) - 1 護岸工の不具合事象の発生状況


のりどめ  
 ③ 法留基礎未施工  
 → 2箇所、112m



④ 護岸端部の処理不備




端部の処理不備 (上流側)

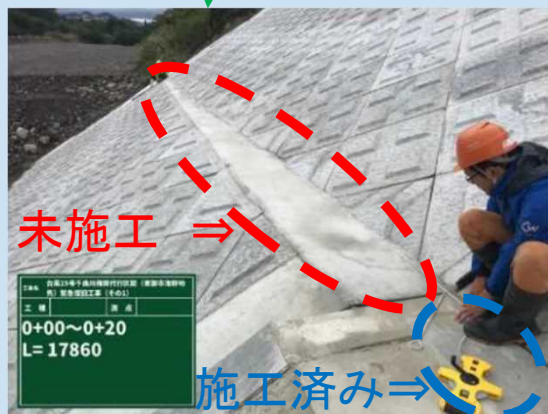

法留基礎未施工 (下流側)



法留基礎未施工 (上流側)

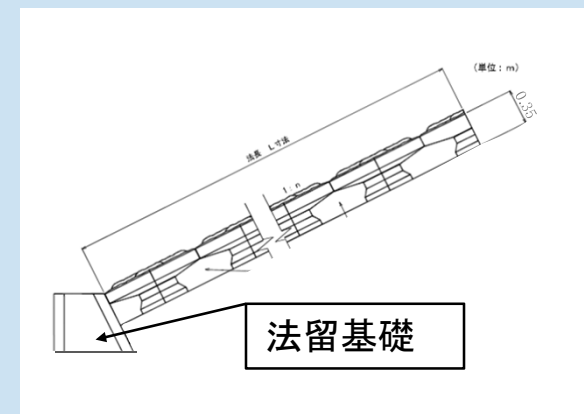

## (2)－2 これまでの経緯

R元. 10. 12 令和元年東日本台風（台風19号）により被災

R元. 10. 20 長野県知事から北陸地方整備局長へ特定河川工事の  
代行要請

R元. 10. 23 大林組が緊急復旧工事に着手

R元. 12. 6 緊急復旧工事完了

R2. 1. 24 本復旧工事着手

R2. 10. 5 【大林組】  
法留基礎未施工を発見

R2. 10. 8 【大林組】  
千曲川河川事務所へ法留基礎未施工を報告



## (2)ー2 これまでの経緯

### R2. 10. 12 【千曲川河川事務所】

法留基礎未施工箇所<sup>の</sup>現地調査実施  
法覆大型ブロックの段差、目開き、目地施工不良等  
を確認  
護岸全体の調査・報告を行うよう大林組に指示

### R2. 12. 23 【大林組】

千曲川河川事務所へ全体調査報告書を提出

(不具合の内容)

- ① 胴込コンクリート充填不足（法覆大型ブロック背面空洞）
- ② 法覆大型ブロックの段差、ブロックの目開き、目地施工不良
- ③ 法留基礎未施工
- ④ 護岸端部の処理不備

### R2. 12. 25 【千曲川河川事務所】

本海野区住民の皆様へ不具合事象の発生について  
(お知らせ) 文書を各戸配付

## (2)ー2 これまでの経緯

R2. 12. 28 【千曲川河川事務所】

不具合が生じた原因の究明及び不具合箇所の改善措置方針について、令和3年1月8日までに提出するよう大林組に指示

R3. 1. 8 【大林組】

千曲川河川事務所へ不具合箇所の改善措置方針を提出  
→ 『**護岸工の全面的な再施工**』

R3. 1. 14 【千曲川河川事務所】

本海野区住民の皆様へ不具合事象への対応について（お知らせ）文書を各戸配付

R3. 1. 14 【千曲川河川事務所】

改善措置方針に基づく改善計画書を令和3年1月29日までに提出するよう大林組に指示
